

Under finner du informasjon om hva som er nytt i standard versjon ISY Prosjekt Plan 2021.1 – 2021.2.

Nyheter i versjon 2021.2 (4.3)

Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:

Oktober 21

- Mulighet for å gjenbruke prosjektoppsett fra et malprosjekt.

I veiviseren for å skape et nytt prosjekt, er det nå en ny side der du kan velge om det nye prosjektet skal benytte bedriftens sitt standard prosjektoppsett, eller om det nye prosjektet skal benytte prosjektoppsettet fra et definert malprosjekt eller et eksisterende prosjekt.

Veiviser for nytt prosjekt

1 2 3 4 5 6

Velg Prosjektoppsett

ISY Prosjekt Plan

Velg om du vil basere prosjektoppsettet for ditt nye prosjekt på bedriftens/løsningens standard oppsett, på et definert malprosjekt, eller på et av dine eksisterende prosjekter. Med prosjektoppsett menes visningsoppsett med felter, rekkefølger og navngivning, samt barstiler med farger, skravur og strektykkelser.

Bruk standard prosjektoppsett

Bruk prosjektoppsett basert på mal

Bruk prosjektoppsett fra et eksisterende prosjekt

Prosjektkode	Navn	Id	Prosjektleder	Sist lagret
MAL	MAL Kursoppdrag	1011	Torger Kjeldstad	2021-10-06 12:3
MAL	MAL hospital	1040	Torger Kjeldstad	2021-10-06 12:3

Avbryt Tilbake Neste Ferdig

Det er følgende oppsett fra malprosjektet som blir gjenbrukt:

- Visningsoppsett (felte, rekkefølge og kolonnebredder)
 - Hvilke visninger som er valgt som synlige, og visningsrekkefølge
 - Hvilke plansett som er valgt å vise i stolpediagrammet i de ulike visningene
 - Navn på visninger (hvis de er endret ifht. standard navn)
 - Navn på felte (hvis de er endret ifht. standard navn)
 - Barstiler (farger, skravur, strektykkelser)
- Innført linjedeling (word wrap) på alle tekstfelte i aktivitetsvisningene.

Tidligere var det linjedeling kun for aktivitetsnavn. Nå er det innført på alle tekstfelte som kan vises i aktivitetstabeller. Linjedeling utføres ved endring av radhøyder.

Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	Kommentar
Aktivitet 1	28.09.2021	22.11.2021	40 dager	Dette er en ganske så lang kommentar.

Det er også innført tool-tip visning av tekst hvis tekstlengden går utover feltets bredde.

Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	Kommentar
Aktivitet 1	28.09.2021	22.11.2021	40 dager	Dette er en ganske så lan...


Dette er en ganske så lang kommentar.

- Optimalisert lagring av status (fra hjemmekontor).

Lagring av status er en ressurskrevende operasjon. Vi lagrer nå 400 aktiviteter om gangen ned til databasen. Dette øker ytelsen betraktelig når man typisk jobber fra hjemmekontor, siden «roundtrip» for kommunikasjon mot databasen typisk krever tar lengere tid enn selve lagringen av data.

- Økt utvalg av farger i redigering av barstiler.

Fargevelgeren i redigering av barstiler er endret, slik at det er mange flere farger å velge mellom. Du kan også angi RGB verdier, for å fritt definere fargen.

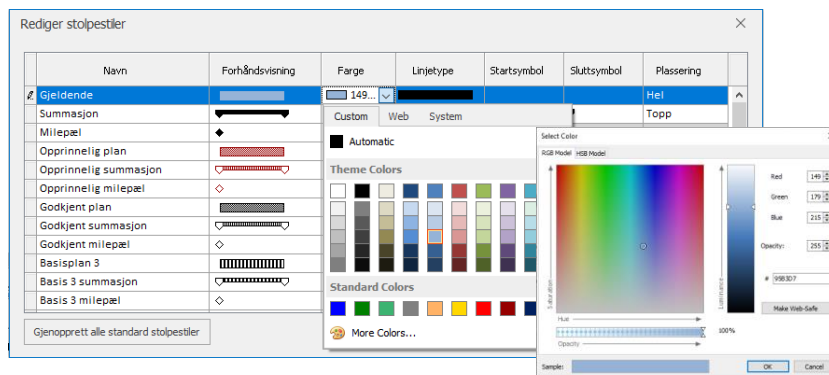

- Mulighet for å bytte periodetype selv om historiske perioder er låst.

Du kan nå bytte periodetype i periodiserte visninger, også når historiske perioder er låst. Ved bytte av periodetype vil også historiske låste perioder vise nye verdier iht. valgt periodetype, men det underliggende datagrunnlaget vil ikke endres for de låste periodene.

Startside	1 1	20210325 Eksempel Bane NOR		mai 2021	juni 2021	juli 2021	august 2021	september 2021	oktober 2021
Visning	1	Prosjekt A	Gjeldende timer	218	240	0	699	683,3	301,7
	2	Subnivå 1	Gjeldende timer	218	240	0	699	250	25
	3	Subnivå 1.1	Gjeldende timer	218	240	0	699	250	25
	4	Aktivitet 11	Gjeldende timer	218	240	0	699	0	0
	5	Aktivitet 12	Gjeldende timer	0	0	0	225	250	25

Det er også et nytt meny punkt «Vis handlinger på periodelås», som gir en dialog som viser hvem som utførte låsing av perioder, hvilken periode det ble låst til og hvilken periodetype som ble benyttet ved låsing.

- Korrigert oppførsel for uttegning av fremdriftsstolper, slik at disse alltid tegnes til periodens sluttdato (statuslinjen) hvis Virkelig fremdrift er identisk lik Planlagt fremdrift. Tidligere ville uttegning påvirkes av perioder med 0 budsjett, typisk der det var periode med 0 i budsjett i forkant av periodens sluttdato, siden Planlagt fremdrift ikke endrer seg over slike perioder.

- Rettet feil som medførte at summasjonsaktiviteter fikk (ekstra) basisplan satt på seg. Årsaken var at summasjonsaktiviteten sin basisplan ikke ble nullstilt, i det tilfellet at kun noen av de underliggende aktivitetene hadde basisplan, og at man flyttet bort disse. Hvis aktiviteter med basisplan i etterkant ble flyttet inn under den samme summasjonen, så fikk den doble basisplan innslag. Doble basisplaner resulterte i feilsituasjoner ved påfølgende åpning av prosjektet. Basisplan kun på en summasjon, der ingen underaktiviteter hadde basisplan, resulterte i feil ved lagring ved overskrivelse av aktuell basisplan, eller etter sletting av den aktuelle summasjonsaktiviteten.

April 21

- Endret konsept for rapporteringsperiode i prosjektet.

Tidligere ble perioden definert gjennom datoer for Periodestart og Periode slutt. Dette er endret til at perioden er definert gjennom en Periode type og Periode. Man kan da velge ulike periodetyper for de enkelte prosjektene.

Frå å bruke datoer

Til å bruke Periode type og Periode

- Web løsning for innrapportering av virkelig fremdrift.

Web modulen er nå utvidet med en ny web-side for innrapportering av virkelig fremdrift på de aktivitetene en prosjektmedarbeider er ansvarlig for. Merk at web modulen krever egen lisens.

Se video her: [Innrapportering av virkelig fremdrift fra web løsning](#)

Definerer «Fremdriftsansvarlige» i ISY Prosjekt Plan

Navn	Fremdriftsansvarlig	Fremdriftstype
☐ Nytt helsebygg		Manuell
☐ Administrasjon		Manuell
Prosjektledelse	Ola Normann (TKJ)	Manuell
Prosjektstyring og rapp...	Kjeldstad, Torger (HA...	Manuell
Eksterne møter		Manuell
Etablere Prosjektbasis	Kjeldstad, Torger (HA...	Manuell
KS2 revisjon		Manuell
☐ Prosjektering Bygg A		Manuell
Anbudspakke 1	Ola Normann (TKJ)	Manuell
Anbudspakke 2	Ola Normann (TKJ)	Manuell

Rapportere virkelig fremdrift fra web løsningen

Nyheter i versjon 2021.1 (4.2) februar 21

Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:

- Forbedret ytelse i Dashboard løsning.

Data for «smultring» og prosjektliste lastes nå kun én gang for hver av de ulike arfanene i dashboard-visningen. Det betyr at det går mye raskere å drille ned fra smultring til prosjektliste, og også mye raskere å filtrere eller sortere på data i prosjektlisten. Tidligere ble det lastet data på nytt fra server for hver av disse operasjonene. Initiell lasting av data tar tilsvarende tid som tidligere.

- Mindre endring i layout i grafiske rapporter

Har endret i utskrift av grafiske rapporter slik at tekstene (Akkumulert) og (Perioden) som vises etter feltnavnene i rapporten, kun legges til hvis man har valgt å vise både kurver og histogrammer i samme rapport. Hvis ikke, så sløyfes denne ekstra informasjonen.

- Ved Fremdriftstype = Planlagt, så er det endret slik at virkelig fremdrift blir satt til 0 % hvis planlagt fremdrift er mindre enn 0 % og til 100 % hvis planlagt fremdrift er større enn 100 %. Dette kan skje ved redigering av periodiske budsjetter, eller ved oppdatering av gjeldende med påfølgende refordeling av gjenstående budsjett.

- Rettet feil i registerrapport på planlagt ressursbelegg

Rapportering av egendefinerte periodiserte budsjetter på bemanning, ble kun korrekt hvis feltet Ressurs timer/Ressurs kostnader var valgt inn i feltgruppen Totalt i rapporten. Dette er nå rettet.

- Rettet feil i lagring av periodiserte verdier ned på reservasjoner, ved endring av periodiske verdier i periodiserte visninger. Feilen skjedde kun hvis opsjonen for relasjon mellom timer og kostnader var satt til «Bruk lik fordeling».

Ved endring av et periodisk timebudsjett, som igjen oppdaterer periodens kostnadsbudsjett, så ble ikke det periodiske kostnadsbudsjettet lagret ned på reservasjonen. Motsatt hvis man endret periodisert kostnadsbudsjett.

- Rettet feil i lagring av periodiserte verdier ned på reservasjoner, ved endring av periodiske verdier i periodiserte visninger. Feilen skjedde kun hvis opsjonen for relasjon mellom timer og kostnader var satt til «Bruk lik fordeling».
